

Piano di Comunicazione lavori

2022/2025

Tangenziale di Napoli: un'autostrada più sicura, più green, più tecnologica

Continuano sulla Tangenziale di Napoli (Autostrada A56), asset strategico al servizio della città e dell'area Flegrea su cui transitano circa 240mila veicoli al giorno (oltre 87 milioni di passaggi all'anno), gli interventi di potenziamento ed ammodernamento del "Piano lavori 2022-2025" in linea con le recenti normative in materia (NTC2018), con le mutate esigenze della mobilità e al passo con lo sviluppo della città e del territorio.

L'investimento dai circa 300 milioni di euro sta interessando le principali infrastrutture (gallerie, viadotti e stazioni) della Tangenziale di Napoli che si sviluppa per circa 20 Km attraversando l'area metropolitana di Napoli da est a ovest, e grazie ai suoi 14 svincoli (per uno sviluppo di circa 22 km) raggiunge direttamente il cuore dei principali quartieri della città.

Il Piano è il risultato di due anni di studi condotti in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli e con il supporto dei più qualificati ricercatori del settore, le cui risultanze, in condivisione con il MIT, con ANSFISA e con le principali Istituzioni locali, consentiranno di ottenere "l'Autostrada cittadina" A56 ancora più sicura, sostenibile, tecnologica, moderna e all'avanguardia, al servizio degli utenti per i prossimi anni.

Risorse impegnate

Circa 300 milioni di euro di investimenti per l'upgrade dell'infrastruttura che vede impegnata manodopera e mezzi con picchi giornalieri di 300 unità e 50 mezzi sul campo che operano prevalentemente di notte al fine di limitare l'impatto sulla viabilità



Avanzamento lavori Gallerie



Adeguamento impiantistico (al D.lgs. 264/2006) e miglioramento strutturale con cantierizzazioni notturne prevalentemente in chiusura di tratta, dal lunedì al venerdì dalle ore 22:00/23:00 alle ore 06:00

Galleria Monte Sant'Angelo Ovest - [lavori ultimati](#)

Galleria Vomero Est (direzione Capodichino) - [lavori ultimati](#)

Galleria Vomero Ovest (direzione Pozzuoli) - [lavori ultimati](#)

Galleria Capodimonte Ovest (direzione Pozzuoli) - lavori eseguiti al 71%

Galleria Capodimonte Est (direzione Capodichino) - lavori eseguiti al 37%

Galleria Capodimonte - Realizzazione di n° 2 By Pass di collegamento dei due fornici - lavori ultimati

Avanzamento lavori stazione ARENELLA

Autosufficienza energetica

La riqualificazione della stazione “Arenella”, lavori iniziati a luglio 2023 e in fase di completamento, rappresenta l’intervento pilota di un sistema in grado di sfruttare le risorse naturali energetiche in modo smart, mirando all’autosufficienza e rendendo sempre più ecosostenibile l’infrastruttura riducendo notevolmente le emissioni di gas nocivi.

La stazione “Arenella”, con 5 porte di transito, conta circa 4 milioni e centomila transiti annui ed è la prima ad essere interessata da quest’attività di riconversione per rendere più ecosostenibile e del tutto autosufficiente la struttura.

Con questa riqualificazione si otterrà una riduzione di 98 tonnellate di emissioni di gas CO₂ cooperando in maniera concreta alla tutela del cambiamento climatico ed incidere positivamente sul Rating ESG (rating di sostenibilità) di Tangenziale di Napoli. Contestualmente, si provvederà ad una nuova e più funzionale distribuzione degli spazi tecnologici e degli ambienti di lavoro per migliorare ancora di più il funzionamento del casello autostradale.

L’intervento rientra, a pieno titolo, nel più ampio obiettivo europeo della riduzione di CO₂ del 55% e della produzione di energia da fonti rinnovabili del 40% entro il 2030 (lavori eseguiti al 70% dell’importo di contratto).

Avanzamento lavori sede direzionale FUORIGROTTA

Autosufficienza energetica

A seguire il processo di trasformazione del fabbricato di Arenella, Tangenziale di Napoli sta portando avanti il progetto di sostenibilità ed autosufficienza dell'area di Fuorigrotta dove insiste la sede Direzionale della società ed il Centro di Esercizio.

In questa sede il progetto si arricchisce di ulteriori elementi; infatti, si è predisposto un sistema di recupero delle acque piovane per il lavaggio delle strade, ed un sistema di stoccaggio dell'energia elettrica non più basato sulle batterie ma tramite il pompaggio e stoccaggio delle riserve d'acqua associato ad impianto idroelettrico che attraverso un salto geodetico si utilizza l'energia prodotta da FER (Fonti di Energia Rinnovabile).

Gli interventi che si realizzeranno per aumentare il rating ESG:

Installazione di impianto FER – Solare termico per preriscaldo HVAC.

Installazione di un sistema di recupero delle acque piovane e recupero degli esistenti Pozzi Artesiani per il lavaggio delle strade

Realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'autosufficienza dell'area.

Realizzazione di impianto di stoccaggio dell'energia elettrica tramite salto geodetico e impianto idroelettrico.

Realizzazione di una piattaforma per la gestione dell'intera rete elettrica di Tangenziale di Napoli con il supporto di un sistema di SMART BUILDING per la gestione intelligente dei carichi elettrici e la conseguente riduzione di emissioni di CO₂ (383 ton CO₂ /anno), rendendo l'area Direzionale di Fuorigrotta autonoma ed autosostenibile.

Il suddetto progetto condiviso con il MIT, consente tra l'altro di conseguire Certificati Bianchi, e aumentare il rating ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE conosciuto come rating di SOSTENIBILITÀ').

Avanzamento lavori viadotti

Adeguamento sismico alle NTC 2018

Viadotto Arena Sant'Antonio: è stata completata nel mese di agosto la sostituzione degli appoggi e l'introduzione di dispositivi antisismici (isolatori) oltre all'installazione della rete di protezione dietro alle barriere di sicurezza bordo ponte sul margine destro in carreggiata Est e Ovest. Ultimati i lavori di adeguamento delle Fondazioni e delle Pile oltre alla riqualifica delle barriere di sicurezza in spartitraffico e sul margine destro in carreggiata Est e Ovest. Sono inoltre stati ultimati i lavori di ripristino corticale delle travi dell'impalcato e di solidarizzazione delle solette dello stesso impalcato. Lavori ultimati.

Rampe di via Cilea: sono stati completati i lavori previsti in progetto delle opere 1008 e 1009. Sono stati completati nel mese di agosto i lavori previsti in progetto all'opera 1007. È stata eliminata la limitazione di transito a 7,5 tonnellate, elevandola a 26 tonnellate (lavori eseguiti al 99% dell'importo complessivo di contratto e perizia). Sono in corso interventi di completamento e rifinitura oltre agli interventi di sistemazione del versante sottostante le opere.

Semi viadotto Volto Santo: i lavori sono stati ultimati nel mese di agosto 2023.

Viadotto di svincolo Via Campana: i lavori sono stati ultimati nel mese di maggio 2025.

Viadotto Via Campana: i lavori sono stati consegnati in data 12.09.2024 e sono attualmente in corso i lavori di ripristino corticale degli impalcati e gli interventi previsti alle Fondazioni delle Pile 1 e 5 (lavori eseguiti al 25% dell'importo di contratto).

Viadotto Calata San Domenico: i lavori sono stati consegnati in data 02.10.2024 e sono attualmente in corso i lavori di ripristino corticale degli impalcati ed i lavori di adeguamento delle Fondazioni delle Pile 6 e 7 (lavori eseguiti al 6% dell'importo di contratto).

Avanzamento lavori viadotti


Monitoraggio dinamico viadotto Capodichino – SISTEMA ARGO

Il progetto del sistema di monitoraggio strutturale dei dispositivi di vincolo del viadotto Capodichino dell'Autostrada A56 (Tangenziale di Napoli) è finalizzato alla valutazione del suo corretto funzionamento per effetto delle azioni antropiche (carichi veicolari) ed ambientali (vento e distorsioni termiche). Lo scopo del monitoraggio è quello di valutare costantemente lo stato di salute del Viadotto e controllare l'evoluzione nel tempo della risposta strutturale sotto i carichi di esercizio (Structural Health Monitoring, SHM).

Il sistema di monitoraggio prevede una misura continua di spostamenti, temperature e velocità del vento, e sarà composto da un insieme di unità di acquisizione dati computerizzate e trasduttori analogici, oltre a tutta la relativa infrastruttura di alimentazione e comunicazione e ad un sistema di videosorveglianza. Tutti i dati vengono gestiti dalla piattaforma ARGO, sviluppata dalla società di Gruppo Movenon S.p.A.

Sono in fase di avvio i test sperimentali per la verifica del sistema di monitoraggio, terminata la fase I dei Test, in corso la stesura dei Test finali.

Ecosostenibilità

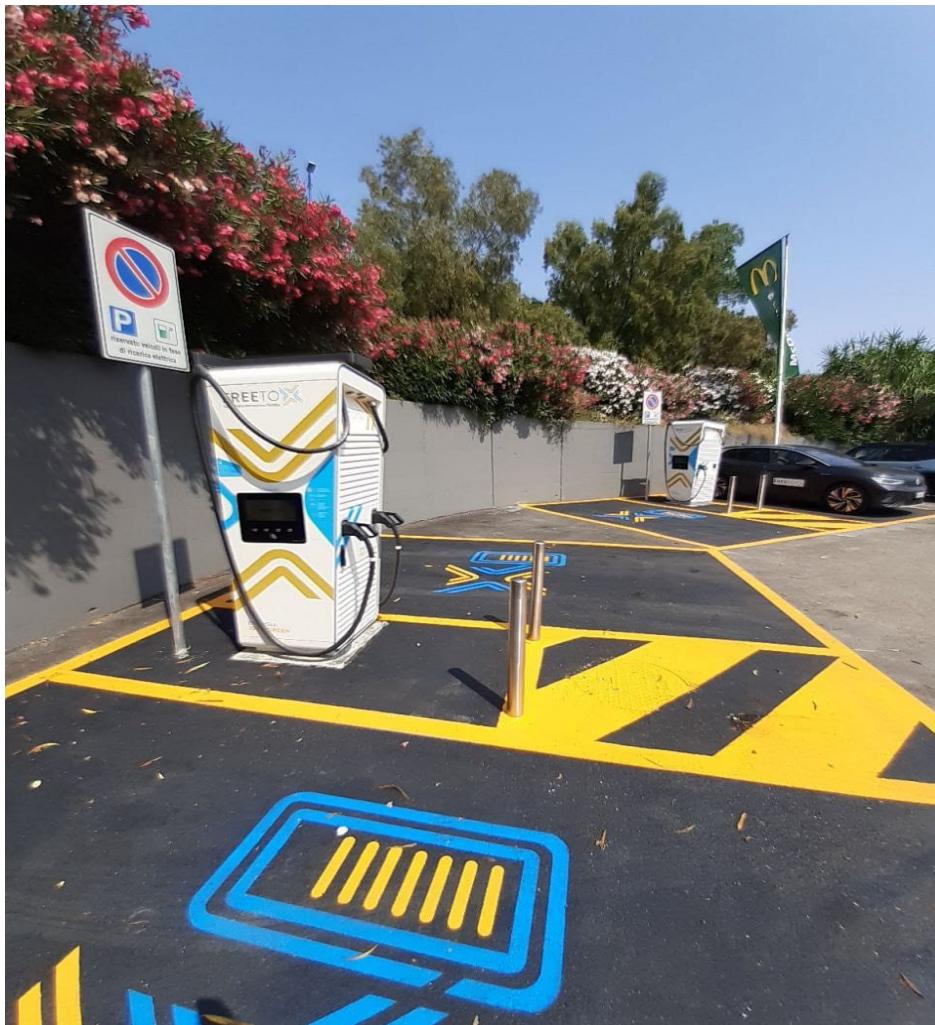

Riduzione immissione gas contro effetto serra

- Due stazioni di ricarica elettrica ad alta capacità operative nelle aree di servizio:
- Antica Campana Est attivata a dicembre 2023 con 4 punti di ricarica Fast
- Doganella attivata a luglio 2023 con 4 punti di ricarica fast a disposizione degli automobilisti
- Incremento aree verdi con assorbimento annuo di Co2 pari a 26,432 tonnellate.
- Tangenziale di Napoli S.p.A. in linea con la Capo Gruppo sta avviando la trasformazione del parco auto con macchine full electric. Nella sede di Fuorigrotta sono presenti 3 colonnine di ricarica per un totale di 6 punti di ricarica.
- Impianti fotovoltaici nelle stazioni di Fuorigrotta, Capodichino, Astroni e Arenella (prima stazione sostenibile ed autosufficiente energeticamente) in cui i lavori sono in fase avanzata di realizzazione.

Illuminazione radente

L'impianto ad illuminazione radente (in sperimentazione su alcune tratte della Tangenziale) è un sistema complesso multifunzionale che permette di illuminare omogeneamente la carreggiata con una migliore visibilità anche in caso di nebbia, comunicare anomalie di traffico all'utenza e rilevare prontamente sinistri o incidenti sulla carreggiata. Grazie alla tecnologia led, nonostante la più fitta presenza di corpi illuminanti rispetto all'illuminazione tradizionale, garantisce un risparmio energetico per unità di chilometro di circa il 33% offrendo una maggiore visibilità con un aumento della sicurezza.

Il sistema centrale riceve inoltre le segnalazioni di viabilità dal corpo illuminante con particolare riferimento a urto barriere, veicolo fermo e veicolo contromano. Il sistema è anche in grado di accendere i led in varie tonalità di colori per segnalare anomalie sul percorso; questo permette di informare in modo coerente ed in tempo reale ai veicoli che sopraggiungono, in una zona soggetta ad una anomalia di traffico, di prestare maggiore attenzione (led ambra lampeggiante o fisso) ed in caso di necessità di indicare che la direzione è errata (led rosso).

Avendo avuto esito positivo la prima fase di sperimentazione si è avviata la progettazione dell'impianto radente sulle opere d'arte e la delocalizzazione dei pali di illuminazione sulla restante parte della tratta viaria in gestione a TaNa.

È stata avviata la progettazione del sistema ad illuminazione dalla stazione "Camaldoli" alla stazione "Fuorigrotta".

Nuovi sistemi di pagamento



- Il progetto prevede l'evoluzione dei sistemi di pedaggio verso tecnologie di tipo Free-Flow attraverso l'identificazione del cliente tramite il rilievo della targa.
- Dematerializzazione del Telepass Ricaricabile con dismissione dell'apparato di bordo.
- Trasformazione di tutte le piste telepedaggio in Tangenziale di Napoli nelle nuove piste 2.0.
- Il 30 settembre 2025 è terminato il periodo di sperimentazione del sistema di pagamento TargaGo l'esito positivo della sperimentazione, i cui dati sono stati condivisi con il MIT, rafforza la convinzione che TargaGO possa evolvere in un servizio permanente, capace di rivoluzionare la mobilità sulla Tangenziale di Napoli.

MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile



- Nell'ambito del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile «MOST» per rendere la mobilità più «GREEN» e «DIGITALE» Tangenziale di Napoli si propone di sviluppare un progetto per rendere Smart Road con Guida connessa ed Autonoma un tracciato di competenza Autostrade per l'Italia e Tangenziale di Napoli. Il tracciato per la sua complessità permette di collegare i principali attrattori ed i punti di smistamento quali Stazioni Ferroviarie, Porto di Napoli ed Aeroporto di Napoli.
- Le Infrastrutture abilitanti ed i relativi servizi sono i seguenti:
- Aree di Servizio ESG;
- Pavimentazioni con materiale riciclato al 50% Amplia/ENI;
- Sistema di ricarica auto elettriche a 700kW;
- HVO (olio digitale idrotrattato) – Carburante biodiesel ADS –ENI;
- Fluidità Traffico – Limiti di velocità Dinamici – Sistemi di Corsia Dinamica con Ausilio di Radar e Video;
- Monitoraggio Traffico – 5G;
- Internet of Things Open Data e Big Data;
- Datex per invio informazioni a Veicolo a Guida Autonoma;
- Smart Cities – Città di Napoli per rendere la mobilità nell'area metropolitana ottimale e sostenibile grazie ad una soluzione innovativa che permette il monitoraggio continuo dei flussi di mobilità e attuazione di politiche di controllo data-driven.
- I lavori di realizzazione sono al 25% per il montaggio della sensoristica in campo. 12
- In corso i lavori di realizzazione dei collegamenti in fibra 80%

Raddoppio rete in fibra ottica



- La nuova rete in fibra ottica si estenderà su tutta la rete autostradale per circa 27 km, collegando le stazioni con la sede Direzionale di Fuorigrotta e grazie al suo dimensionamento potrà supportare i servizi della Smart Road ed i futuri servizi Smart Cities, in quanto la Tangenziale di Napoli è una arteria autostradale “cittadina”.
- Con il raddoppio della fibra sarà possibile:
 - Abilitare gli scenari delle Smart Roads a favore della sicurezza e per una migliore esperienza di viaggio;
 - Rendere possibile i sistemi di sensoristica per il monitoraggio sicuro delle opere d'arte e dell'infrastruttura e per servizi innovativi (controllo del traffico, info viabilità e meteo);
 - Possibilità di interazione in tempo reale con i clienti attraverso sistemi tecnologici ad hoc.;
 - Rendere disponibile agli Operatori Terzi un'infrastruttura utile alla diminuzione del digital divide;
- I lavori di realizzazione sono terminati il 05/08/2024



tangenziale
di Napoli



Grazie
